Kort verslag inloopbijeenkomst werkzaamheden Middenweg en Oude Schulpweg Egmond-Binnen

JdB GWW B.V.

Airborne Avenue 86

2133LV Hoofddorp

T 023 561 33 29
E info@jdbgroep.nl
W jdbgroep.nl

Geachte bewoner(s),

Maandag 9 september is er een inloopbijeenkomst geweest in Nieuw Westert over de werkzaamheden **Middenweg en Oude Schulpweg**. De aanwezigen zijn geïnformeerd over de planning, de aard van de werkzaamheden en de mogelijke gevolgen voor de bereikbaarheid van uw woning.

Het project bestaat uit het verwijderen van de asfaltverharding en het aanbrengen van bestrating als nieuwe verharding. Daarnaast worden er ook bomen, hagen en ongewenste soorten verwijderd en nieuwe inheemse haag en bomen geplant.

Hieronder zijn de planning en een kaart van de werkzaamheden weergegeven. Deze waren tijdens de inloopbijeenkomst te zien en werden toegelicht. De werkzaamheden **starten 28 september en zijn gereed op 18 december 2026.**

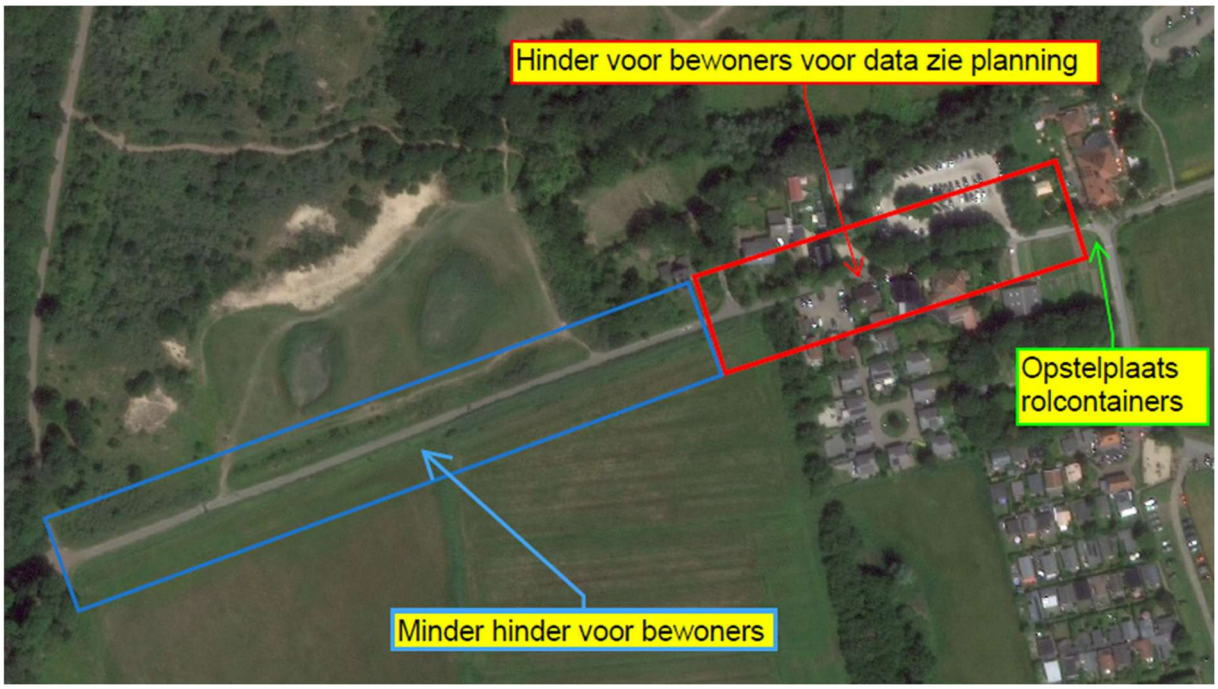

De bijgevoegde planning laat de werkzaamheden zien. Blauw en zwart geven hinder voor u maar geen beperkingen in bereikbaarheid. Bij de rode vakken zijn de woningen niet bereikbaar tussen 7.00-16.00 uur op weekdagen. Nooddiensten kunnen wel bij de woningen. Buiten deze werktijden zijn de woningen altijd bereikbaar. De planning is een leidraad, als er iets mee of tegen zit kan de data iets wijzigen.

Heeft u na dit schrijven nog vragen, kunt u contact opnemen met:

Nico Scheerman	of	Matthijs Stijger
06 – 4628 3600		06 – 4337 7195
n.scheerman@jdbgroep.nl		m.stijger@jdbgroep.nl

Met vriendelijke groet,

Matthijs Stijger

PLANNING

Versie 26-039.1, d.d. 3 september 2026

OPDRACHTGEVER : PWN

PROJECT : Middenweg Egmond-Binnen
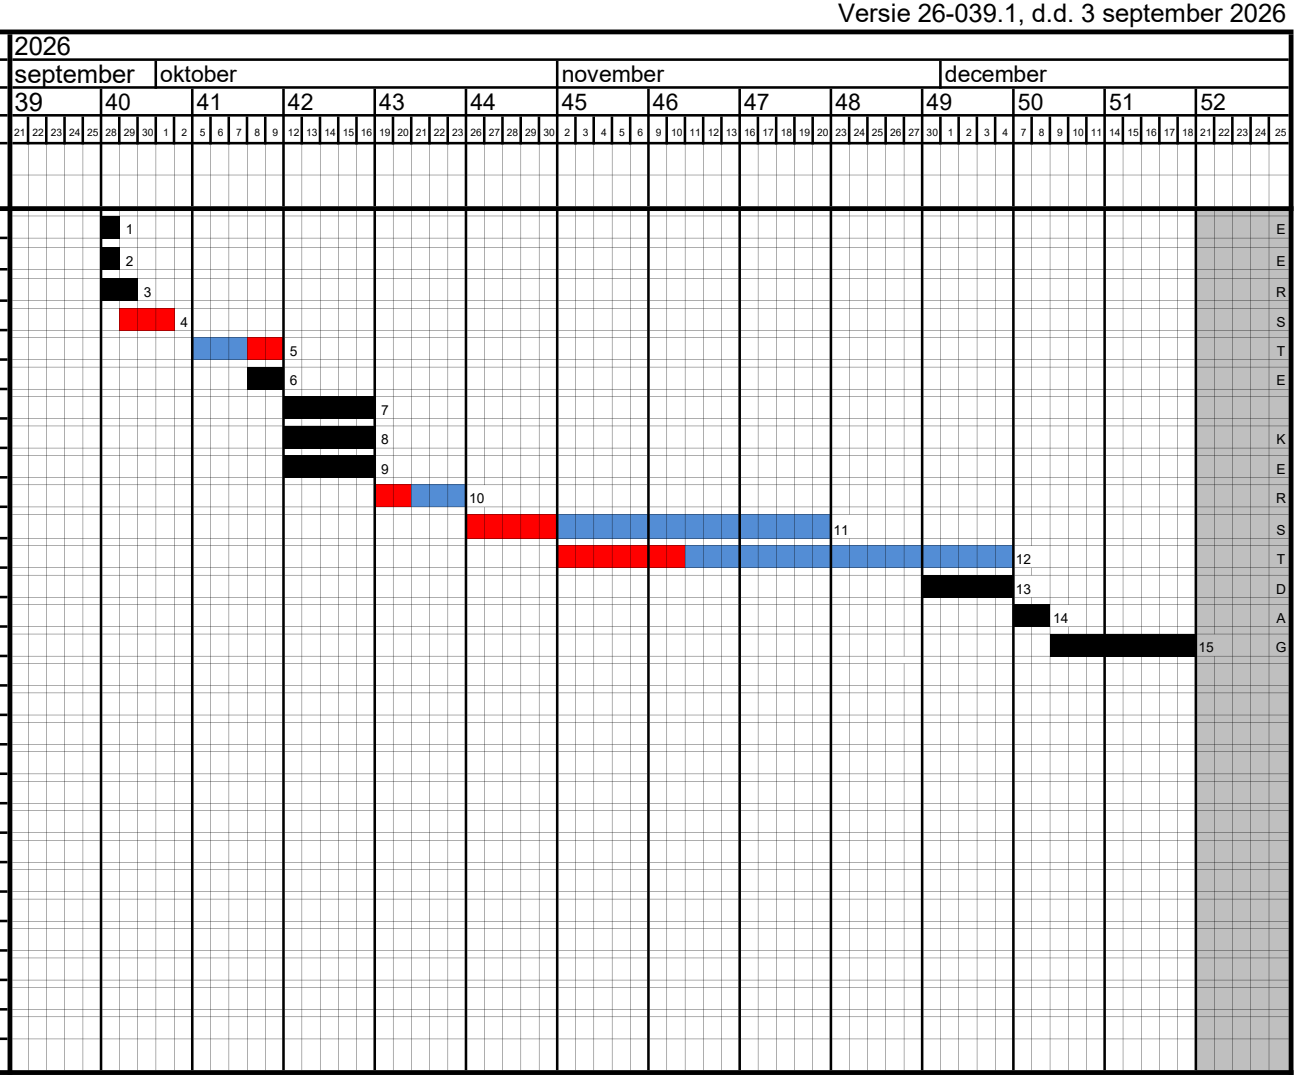
Omschrijving	
1. Plaatsen afzetting en omleidingsroute	
2. Inrichten depot en ketenpark	
3. Aanbrengen rijplaten	
4. Verwijderen bomen	
5. Opbreken asfalt en funderingslaag	
6. Aanbrengen rijplaten bewoners	
7. Aanleg kabel KPN (Hanab)	
8. Afvoeren verharding vanaf depot	
9. Aanvoer betongranulaat naar depot	
10. Aanbrengen wegfundering	
11. Aanbrengen opsluitbanden	
12. Aanbrengen betonstraatstenen	
13. Aanbrengen haag en bomen	
14. Aanbrengen terreininrichting, hekwerk	
15. Buffer onwerkbaar weer	
16.	
17.	
18. = hinder voor bewoners	
19.	
38.	
39.	
40.	
41.	
42.	
43.	
44.	
45.	
46.
